

# A-HUS

| Jnr | Kogus | Laius | Paksus | Pikkus | Kirjeldus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | 45 | 2960 | 45x95 |
| 2 | 1 | 95 | 45 | 2256 | 45x95 |
| 3 | 1 | 45 | 45 | 320 | 45x45 |
| 4 | 3 | 45 | 45 | 1380 | 45x45 |
| 5 | 3 | 45 | 45 | 733 | 45x45 |
| 6 | 2 | 45 | 45 | 795 | 45x45 |
| 7 | 1 | 95 | 45 | 2630 | 45x95 |
| 8 | 1 | 145 | 45 | 3775 | 45x145 |
| 9 | 1 | 45 | 45 | 2583 | 45x45 |
| 10 | 2 | 45 | 45 | 1090 | 45x45 |
| 11 | 1 | 45 | 45 | 3775 | 45x45 |
| 12 | 2 | 45 | 45 | 2000 | 45x45 |
| 13 | 2 | 45 | 45 | 1500 | 45x45 |
| 14 | 6 | 95 | 45 | 555 | 45x95 |
| 15 | 1 | 95 | 45 | 1155 | 45x95 |
| 16 | 1 | 145 | 45 | 2670 | 45x145 |
| 17 | 1 | 95 | 45 | 2448 | 45x95 |
| 18 | 1 | 45 | 45 | 2670 | 45x45 |
| 19 | 2 | 45 | 45 | 1155 | 45x45 |
| 20 | 1 | 95 | 45 | 250 | 45x95 |
| 21 | 3 | 45 | 45 | 260 | 45x45 |
| 22 | 1 | 95 | 45 | 726 | 45x95 |
| 23 | 1 | 95 | 45 | 655 | 45x95 |

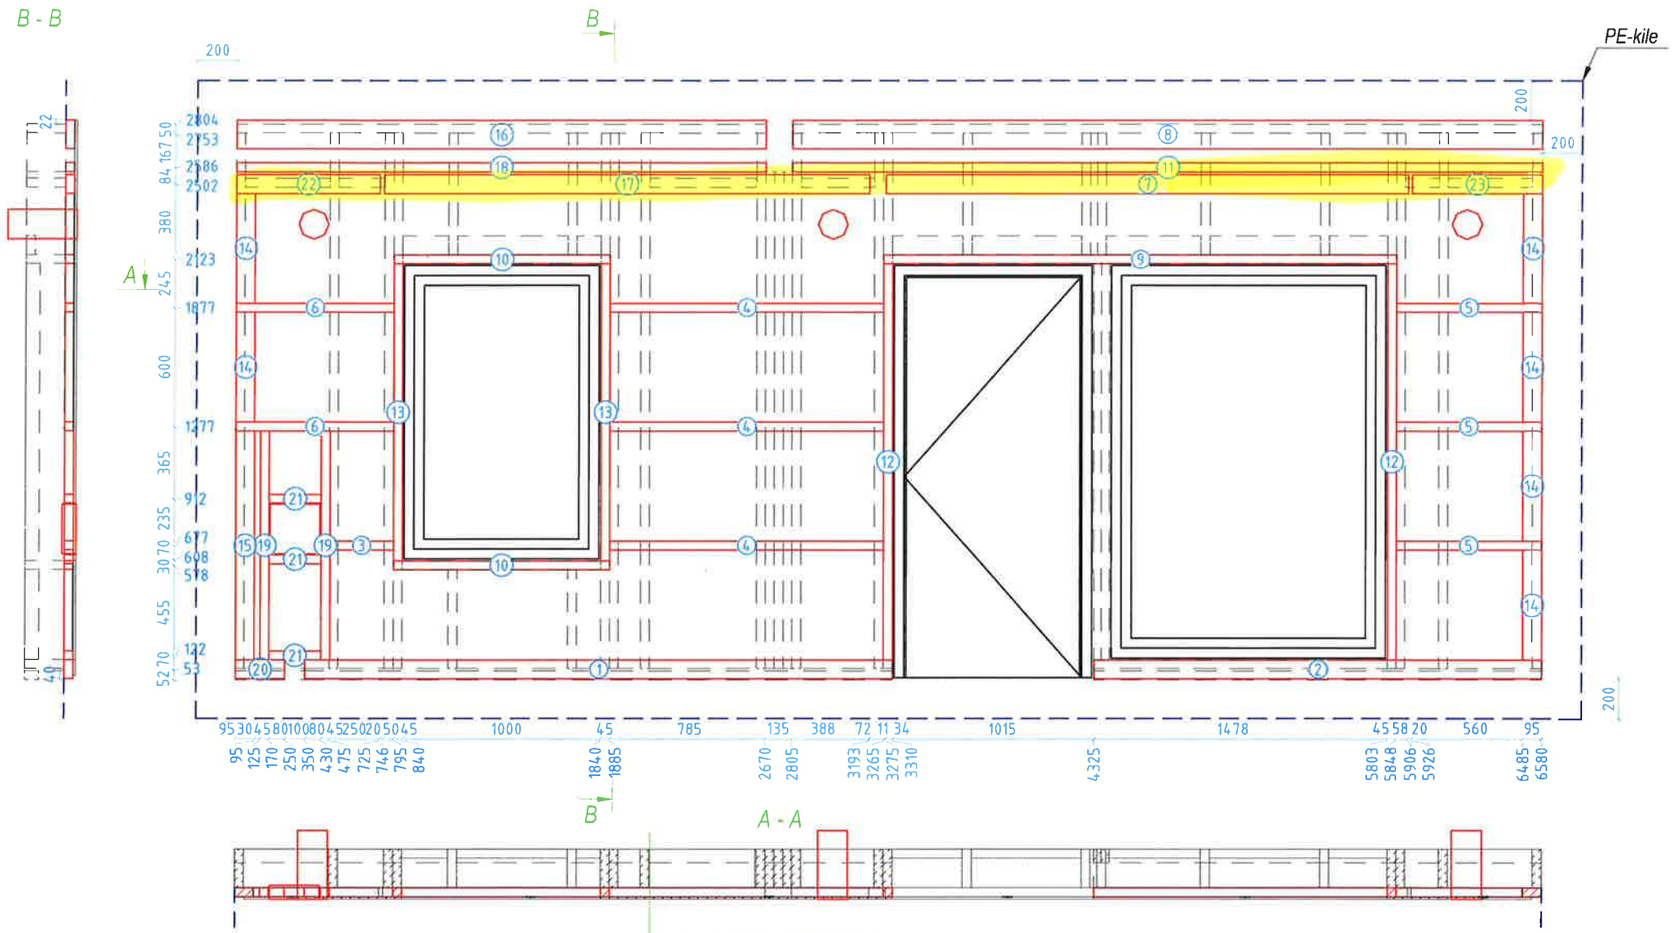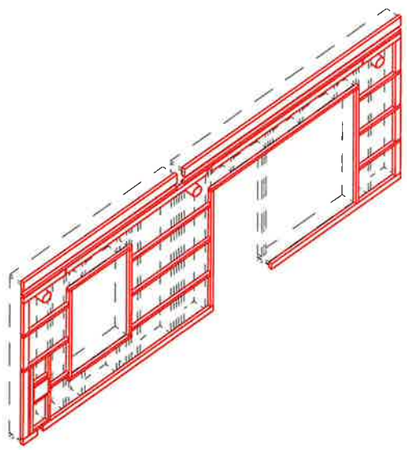

- Laudis UYVH 21x133/145 mm
- Tuulutusliist 28x70 mm
- Soojustusplaat WAS35tt 45 mm / WAS35t 30 mm + Niiskuskindel vineer 15 mm
- Tuuletõkkekangas
- Karkass C24 45x195 mm / Isover KT-37 200 mm
- Pe-kile 0,2 mm
- Horisontaalroov 45x45 mm / Isover KT-37 50 mm
- Elekter
- Gyproc GN 13 mm

Lisakarkassi kinnitamine: nael 3,1x90 G, samm 150 mm



Q-haus Baltic OÜ
Osmussaare 8, 13811 Tallinn
GSM +372 55 11 000
fax +372 69 99 660
www.q-haus.eu



| PROJECT | CUSTOMER | CONTRACT NR. | DATE |
|---|---|---|---|
| Bonava HusA | Bonava Sverige AB | | 08.12.2016 |
| | | | SCALE/PAPER SIZE: 1:30/A3L |
| DRAWING: EW Lisakarkass 45x45 mm | | DESIGNERS: Kristo Kalda | DRAWING NR.: EW101 |
| | | | SHEET: 2 / 7 |


It is not allowed to copy, hand over to third parties or use this drawing for other purposes than in connection to the order from Q-haus without Q-haus written consel.

# A - HUS

| Jnr | Kogus | Laius | Paksus | Pikkus | Kirjeldus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 45 | 195 | 2702 | 45x195 C24 |
| 2 | 7 | 45 | 195 | 614 | 45x195 C24 |
| 3 | 2 | 45 | 195 | 498 | 45x195 C24 |
| 4 | 1 | 45 | 70 | 2256 | 45x70 |
| 5 | 1 | 45 | 195 | 3775 | 45x195 C24 |
| 6 | 1 | 45 | 195 | 2493 | 45x195 C24 |
| 7 | 2 | 39 | 70 | 1998 | 39x70 |
| 8 | 1 | 45 | 195 | 1478 | 45x195 C24 |
| 9 | 2 | 45 | 195 | 1000 | 45x195 C24 |
| 10 | 1 | 195 | 12 | 2256 | Plywood |
| 11 | 1 | 195 | 12 | 3310 | Plywood |
| 12 | 1 | 45 | 70 | 3310 | 45x70 |
| 13 | 2 | 45 | 195 | 428 | 45x195 C24 |
| 14 | 1 | 45 | 195 | 370 | 45x195 C24 |
| 15 | 1 | 45 | 195 | 170 | 45x195 C24 |
| 16 | 1 | 45 | 195 | 233 | 45x195 C24 |
| 17 | 1 | 45 | 195 | 533 | 45x195 C24 |
| 18 | 1 | 45 | 195 | 2670 | 45x195 C24 |
| 19 | 3 | 45 | 195 | 2507 | 45x195 C24 |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 347 | Fresh_D150_TL80F-dB |
| 21 | 1 | 250 | 250 | 70 | VUK |
| 22 | 1 | 95 | 45 | 295 | 45x95 |
| 23 | 3 | 95 | 45 | 555 | 45x95 |
| 24 | 1 | 95 | 45 | 477 | 45x95 |
| 25 | 1 | 95 | 45 | 353 | 45x95 |
| 26 | 1 | 95 | 45 | 123 | 45x95 |
| 27 | 1 | 95 | 45 | 233 | 45x95 |

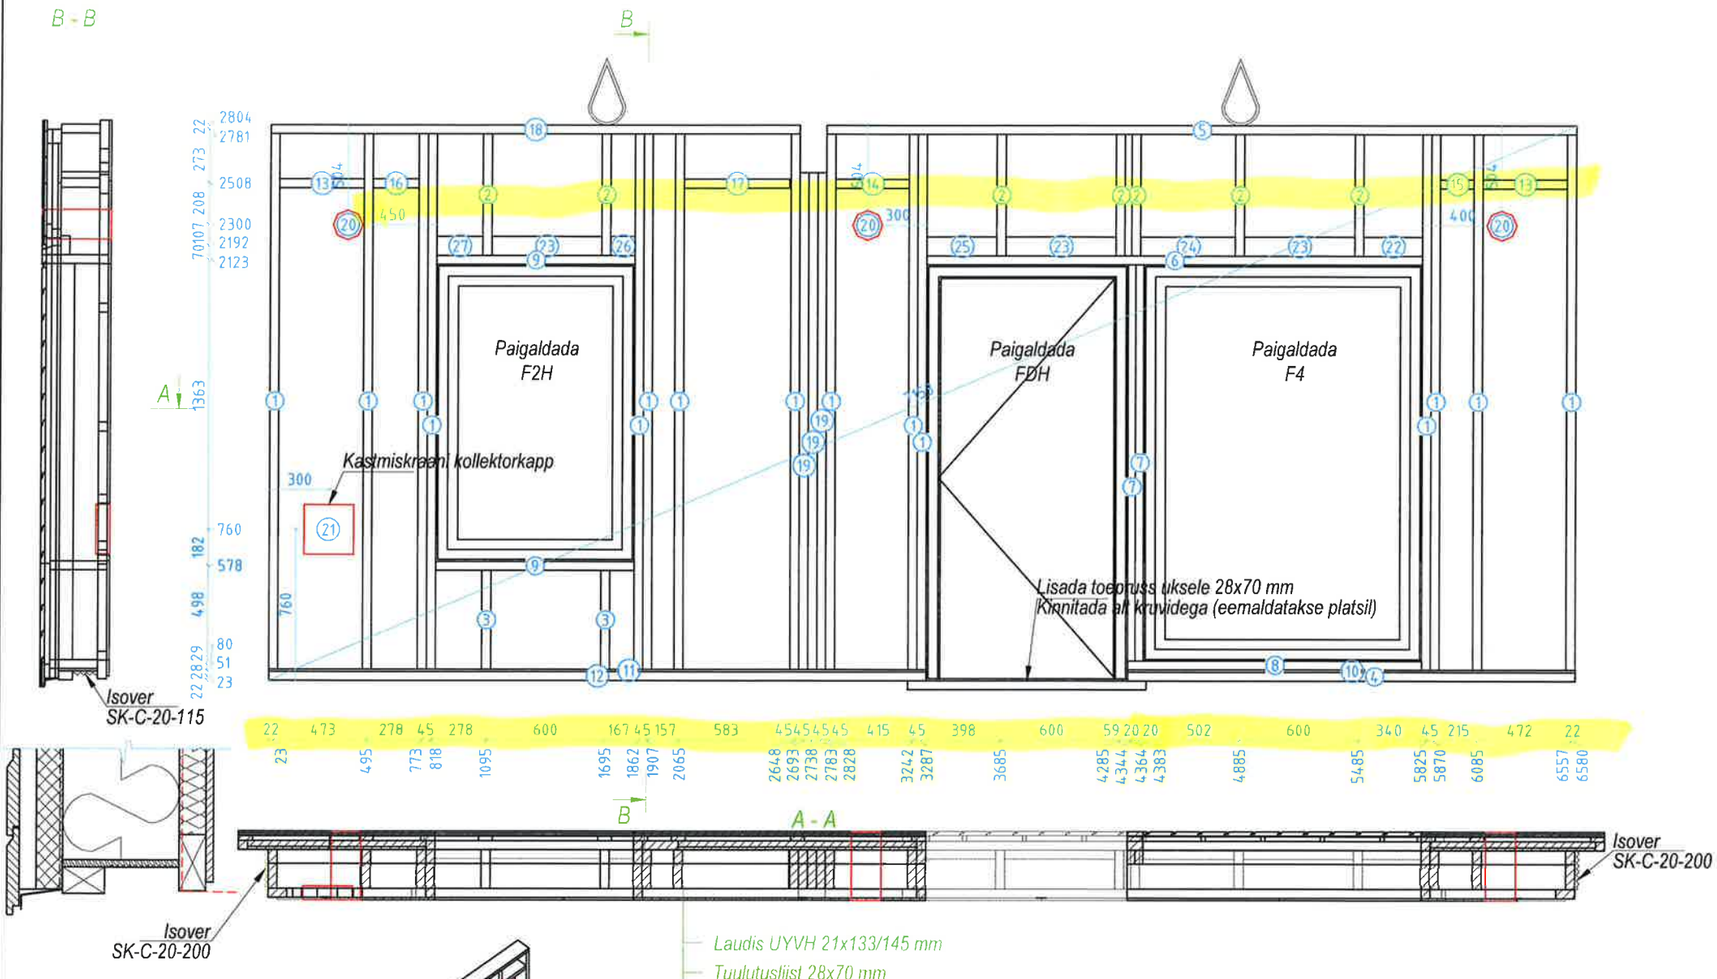

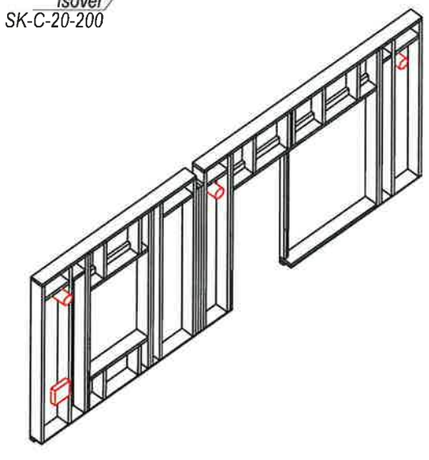- Laudis UYVH 21x133/145 mm
- Tuulutusliist 28x70 mm
- Soojustusplaat WAS35tt 45 mm / WAS35t 30 mm + Niiskuskindel vineer 15 mm
- Tuuletõkkekangas
- Karkass C24 45x195 mm / Isover KT-37 200 mm
- Pe-kile 0,2 mm
- Horisontaalroov 45x45 mm / Isover KT-37 50 mm
- Elekter
- Gyproc GN 13 mm

Karkassi kinnitamine: kammnaelad ja kruvid 6x120 / 6x150 mm


Q-haus
Q-haus Baltic OÜ
Osmussaare 8, 13811 Tallinn
GSM +372 55 11 000
fax +372 69 99 660
www.q-haus.eu



| PROJECT | CUSTOMER | CONTRACT NR. | DATE |
|---|---|---|---|
| Bonava HusA | Bonava Sverige AB | | 08.12.2016 |
| | | | SCALE/PAPER SIZE: 1:30/A3L |
| DRAWING | | DESIGNERS | DRAWING NR. |
| EW Karkass 45x195 mm | | Kristo Kalda | EW101 |
| | | | SHEET: 1 / 7 |


It is not allowed to copy, hand over to third parties or use this drawing for other purposes than in connection to the order from Q-haus without Q-haus written conset.

E-HUS

## Panelsida


# Långa stroppar för säkrare koppling av element till kran!

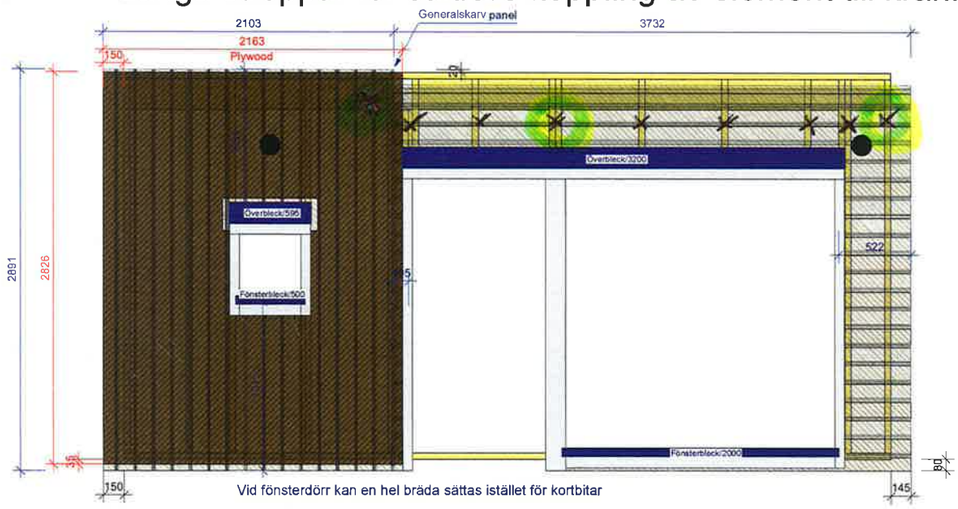




Vid fönsterdörr kan en hel bräda sättas istället för kortbitar


## Stomningssida


⚠ = Tyngdpunkten

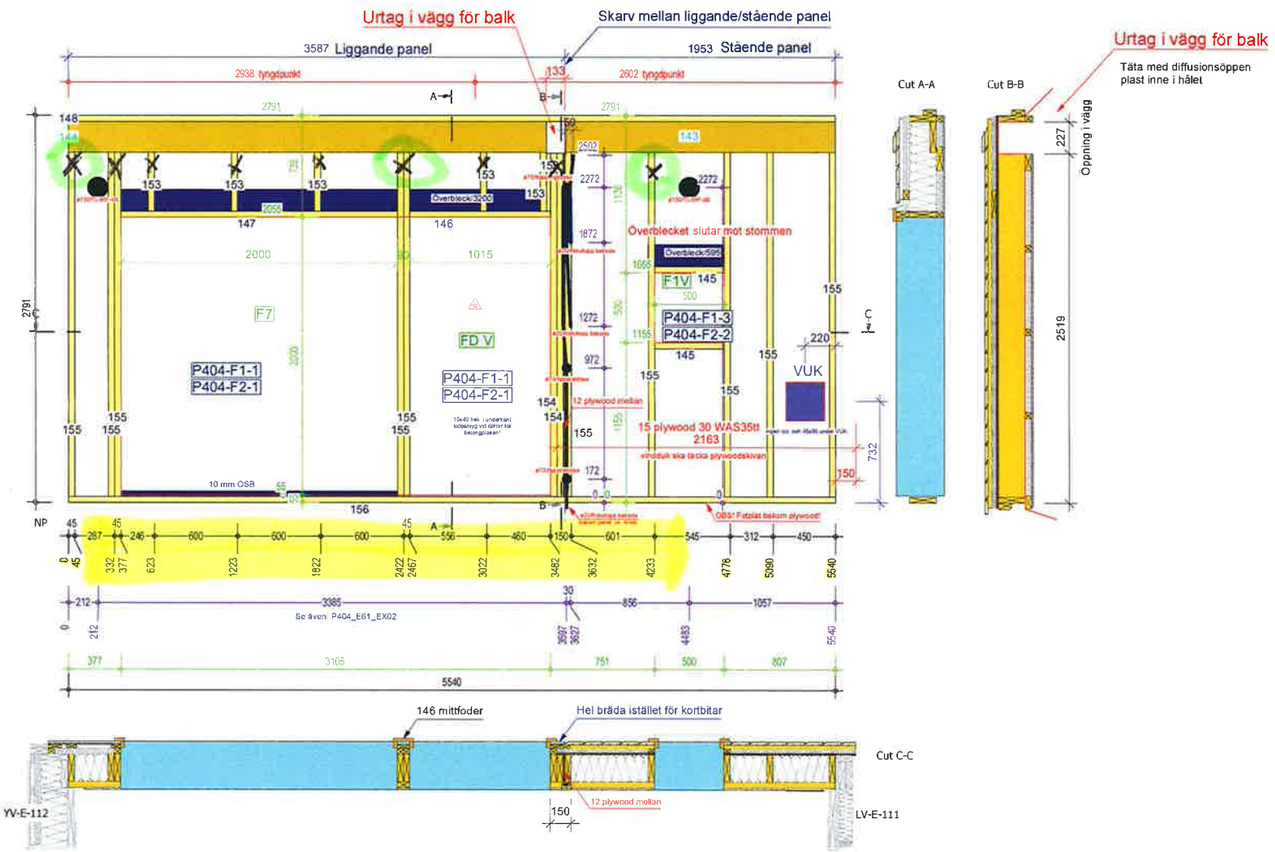


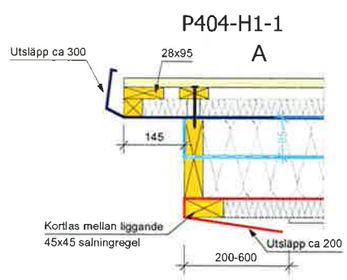


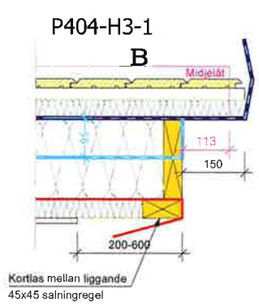

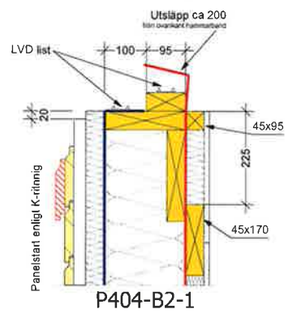

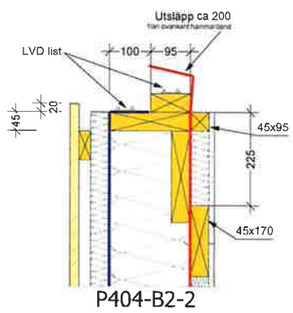
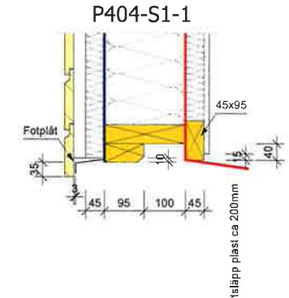
### Blockplan

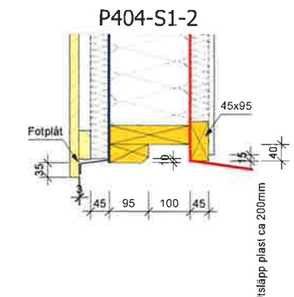


### Vägguppbyggnad

13 Gips
45 Mineralull mellan
45x45 Liggande salning c600
Diffusionssparr
195 mineralull mellan
45x195 regelstomme c600
Vindfolie
45 Fasadskiva Paroc WAS35tt
28x70 spiklakt (luftning)
22x145 panel, Liggande WB021 / stående WB027

### Infästning skivmatrial

13 gips - Skruv Aerfast 40x3,9 (AT10001) c150
15 Plywood - Rullbandad spik aerfast 2,8x50 (RP5028V) c75

Avsluta aldrig gipsskivan med spakelkant mot dörrhål eller väggkant

### El

Samtliga rör 20mm diameter om inget annat anges.

### Färger

Se separat dokument "Utvändiga Kulörer"

### Panelindelning

Börja med en hel bräda över överbleckет.
2305mm från U.K. stomme till O.K. gällande brada cc panel 133

| REV | ANT | DATUM | REVIDERINGEN AVSER | SIGN |
|---|---|---|---|---|

STATUS: Hustyp E

**ÅTVIDABERGSHUS®**

**Åtvidabergs Huskomponenter AB**
BOX 100, 597 22 Åtvidaberg
tfn: 0120-148 30 fax: 0120-297 67
info@atvidabergshus.se

Väggnamn: YV-E-113
Plan: 07-Plan 1
Vikt: 1031 kg

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITAD AV | GRANSKAD AV | DATUM 19.04.2017 | BESTÄLLNINGS-NR P16091 | SKALA 1:30 | (A2) | RITNINGSNUMMER YV-E-113 |
